

"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DEI GIARDINI E DELLE AREE PERTINENZIALI DEI MUSEI DI BORGO CASTELLO"

C.I.G. ZE02A0F8B1

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA

COMMITTENTE

ERPAC

Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Via Armando Diaz, 5
34170 Gorizia (GO)

Responsabile Unico del Procedimento
dott. Massimiliano Zamar
Via Armando Diaz, 5
34170 Gorizia (GO)
erpac@regione.fvg.it

PROGETTISTI INCARICATI

STRADIVARIE
ARCHITETTURA E PAESAGGIO

Stradivarie Architetti Associati (Mandante)

Via Cecilia de Rittmeyer, 14
34134 Trieste
pi./c.f.01175480324
tel. 040 2601675
studio@stradivarie.it
www.stradivarie.it

Consultente Impianti elettrici

SMART PROGETTI - p.i Federico Cicutto
Via Giovanni Cimabue, 17
30027 San Donà di Piave (VE)
p.i./c.f. 04364060279
t. 0421 1886000
info@smartprogetti.com
www.smartprogetti.com

Coordinatore unico della progettazione e responsabile delle diverse prestazioni specialistiche

arch. Claudia Marcon

Progettazione

arch. Claudia Marcon
paesaggista Roberto Bonutto

Collaboratori alla progettazione

arch. Nicholas Bonini
arch. Giulia Bratos

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

arch. Diana Lohse

CODICE ELABORATO:

DOC_12

CODICE FILE:
216_A_DOC_12.pdf

REV.
02

oggetto:

Cronoprogramma dei lavori

scala:

//


data:

CRONOGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE PERTINENZIALI DEI MUSEI DI BORGO CASTELLO

CRONOGRAMMA / GANTT: 120 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

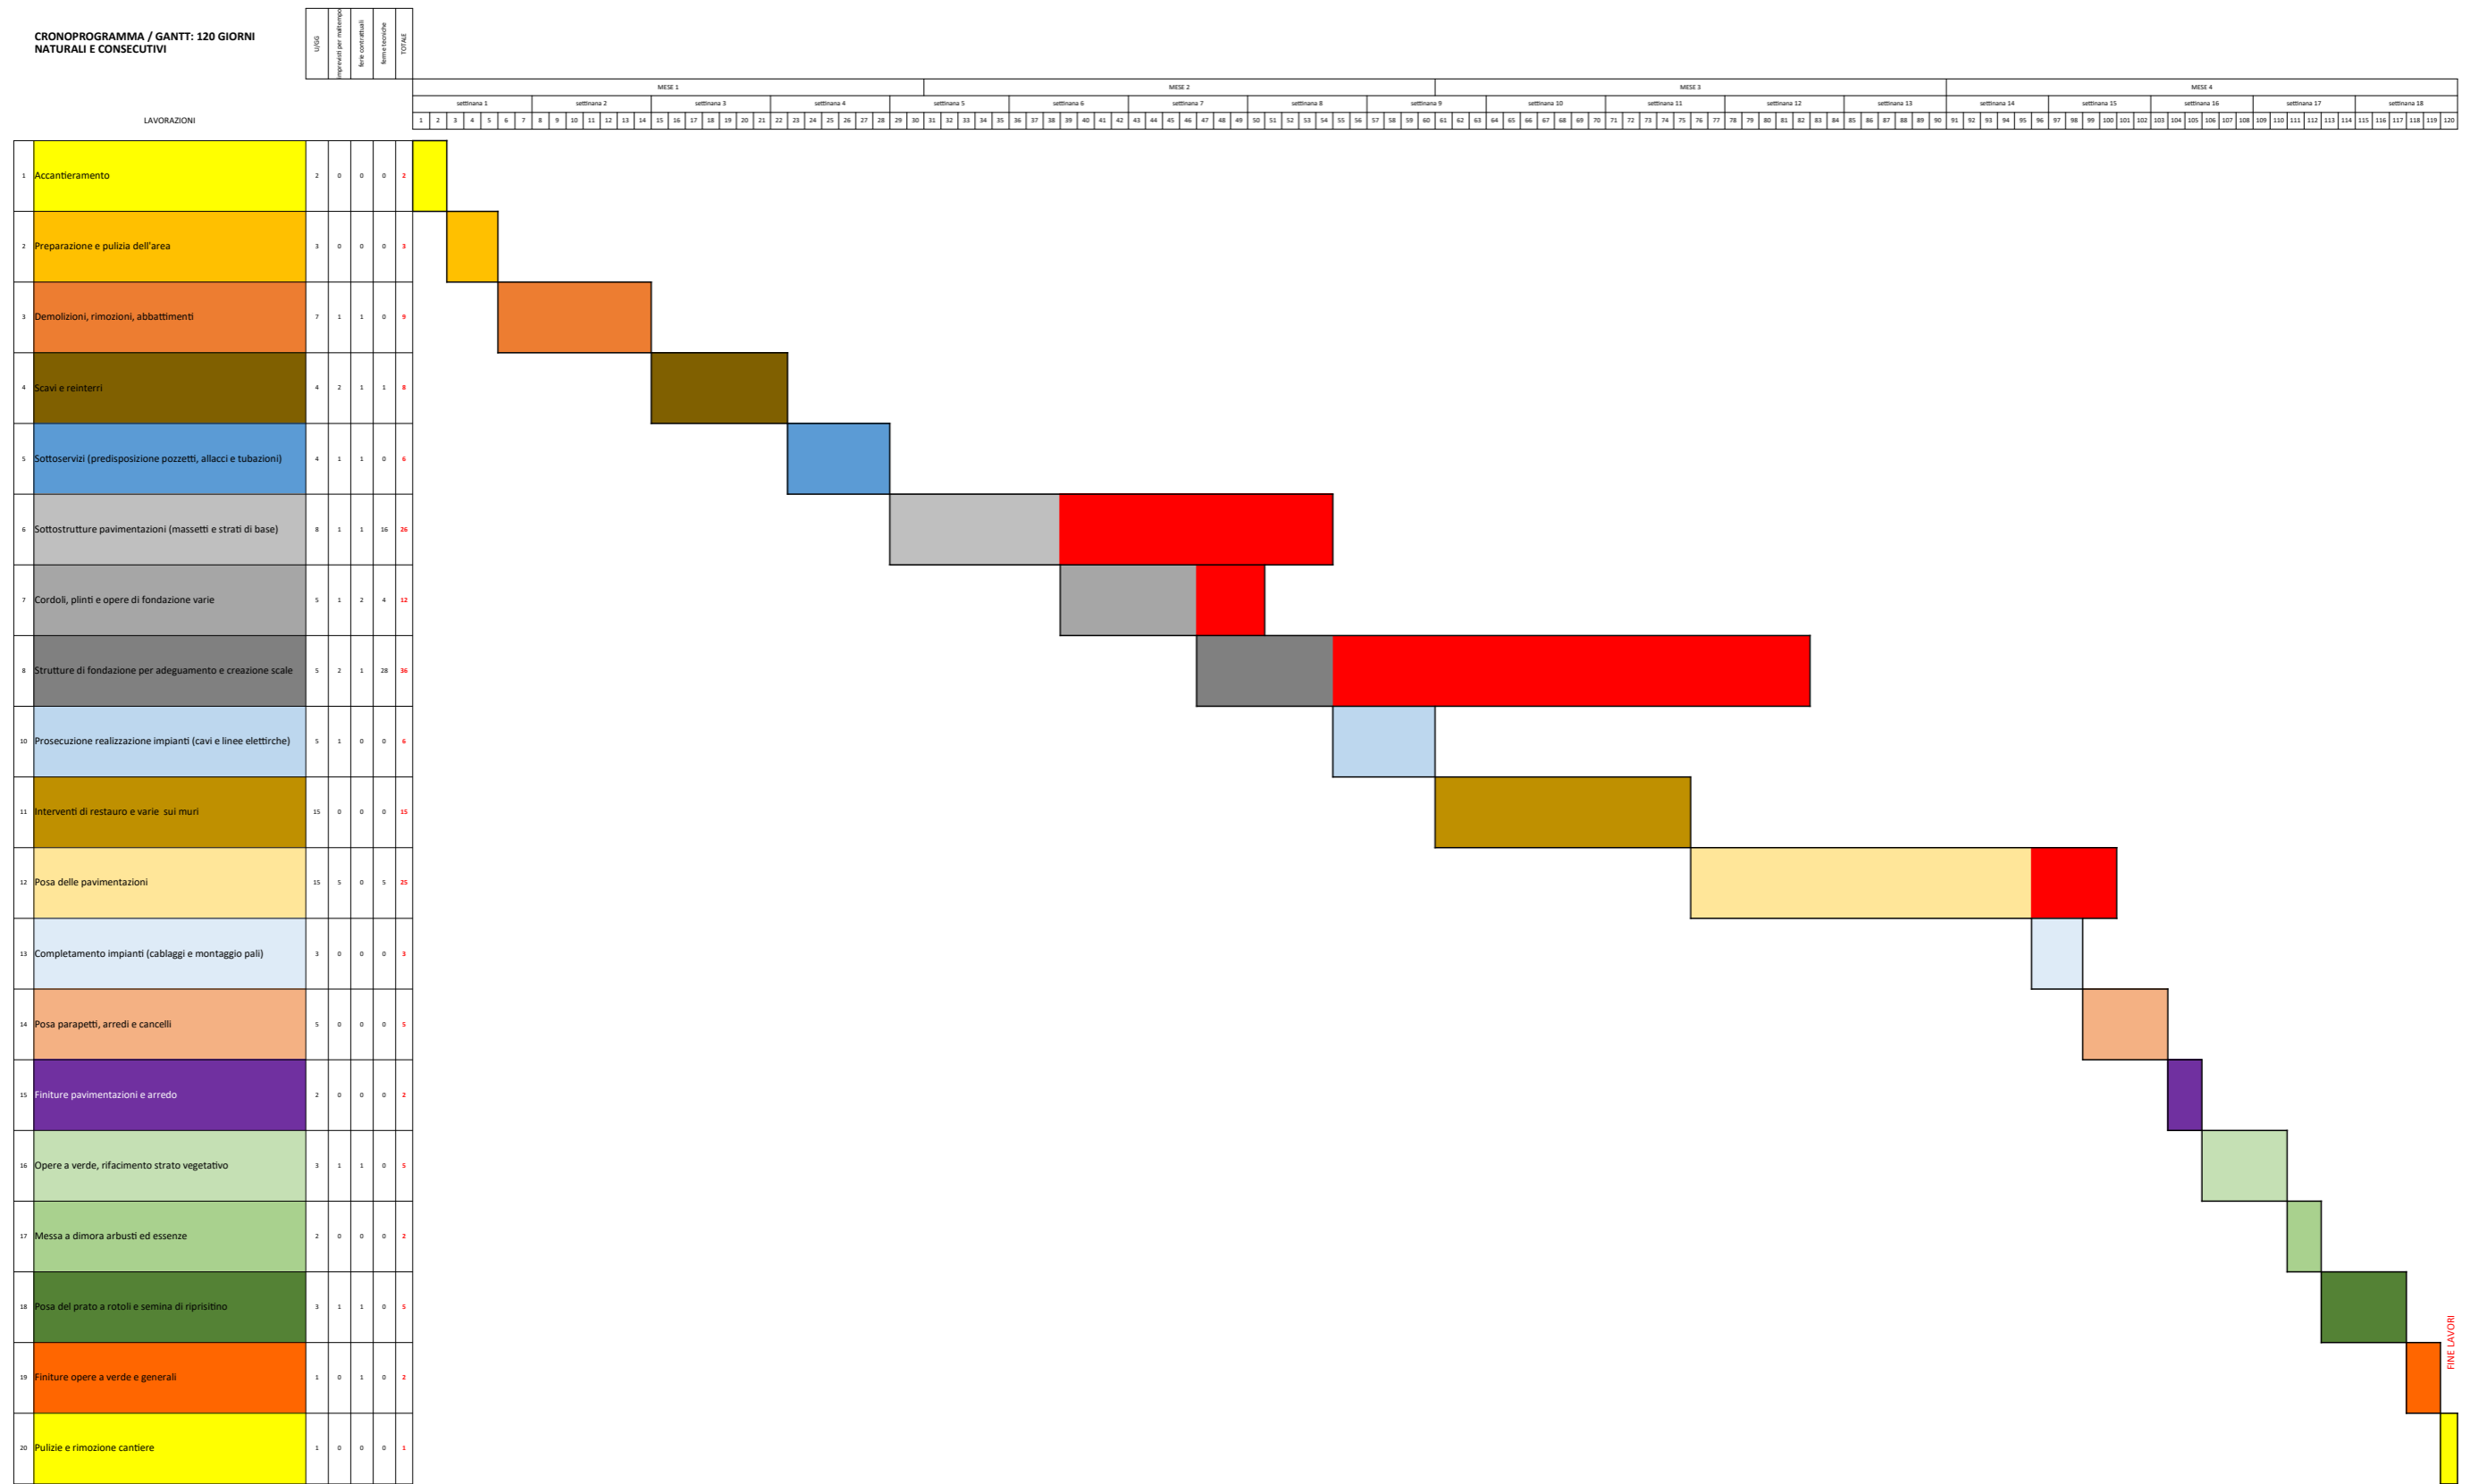

totale U/GG teorici	93
totale U/GG impreveduti per maltempo	16
totale U/GG per ferie contrattuali	19
totale U/GG per ferme tecniche	54
totale U/GG	173
composizione squadre (numero medio operai presente in cantiere)	3
composizione squadre (numero massimo operai presente in cantiere)	5
TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI	120
TOTALE SETTIMANE NATURALI E CONSECUTIVE	18
TOTALE MESI NATURALI E CONSECUTIVI	4

FASI DI ESECUZIONE**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE PERTINENZIALI DEI MUSEI DI BORGO CASTELLO

CRONOPROGRAMMA / GANTT: 120 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

FASE 1	riqualificazione giardini ambito 1	90	FASE 1																				
FASE 2	formazione percorsi ambito 2	30	FASE 2																				
	TOTALE	120																					
